


## 第 2 号議案

むこうやま  
復旧治山事業 向山地区 多野郡上野村

着工年度 平成13年度  
評価理由 10年継続


### 1. 事業の目的

- ・平成13年度事業施工中の豪雨により崩壊が拡大崩壊し、下部村道の通行止めにより、上流の胡桃平集落が一時孤立するなどの被害が発生、その後も土砂の流出が懸念された。
- ・下流域の保全を図るため、不安定土砂の排除(法切工)や切り取り面の保護(法枠工等)を実施し斜面の安定を図る。

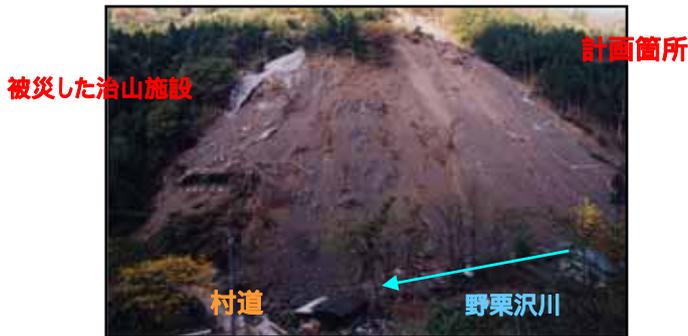

#### 位置図

上野村役場

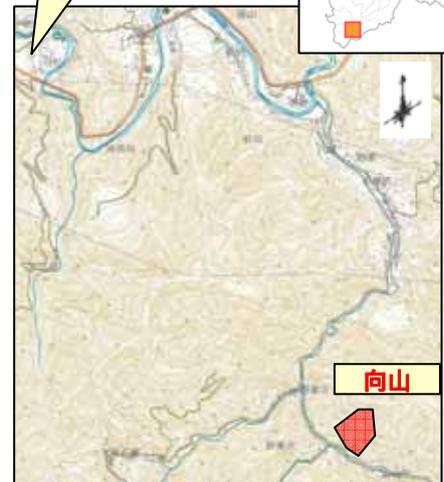

### 2. 事業概要と進捗状況

#### 事業概要

事業場所	うえのむら おおあざ のぐりざわ(むこうやま) 上野村大字野栗沢 (向山)	
区分	今回	事業当初
全体事業費	1,597百万円	780百万円
全体事業費増減の理由	切土法面の安定を図るため法枠工や谷止工、流路工等工種の増工による	
事業期間	H13～H26	H13～H21
事業内容	法切工 69,800m <sup>3</sup> 法枠工15,831m <sup>2</sup> 実播工 444m <sup>2</sup> 谷止工1個433m <sup>3</sup> 流路工 153m 水路工 170m	法切工 78,100m <sup>3</sup> 実播工 20,000m <sup>2</sup>

#### 事業経緯

年度	主な経緯
H13	山腹崩壊発生
H14	法切工着手
H21	法枠工等施工中

#### 進捗状況

区分	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)
事業費	1,597百万円	704百万円 (44.1%)
法切工	69,800 m <sup>3</sup>	39,453m <sup>3</sup> (56.5%)
法枠工	15,831 m <sup>2</sup>	5,831 m <sup>2</sup> (36.8%)
実播工	444 m <sup>2</sup>	444m <sup>2</sup> (100.0%)
谷止工	1個(433m <sup>3</sup> )	0個(0m <sup>3</sup> ) (0.0%)
流路工	153m	0m (0.0%)
水路工	170m	0m (0.0%)
