

第7号議案

社会資本整備総合交付金事業(河川改修)
 一級河川寺沢川 前橋市

着工年度 平成8年度
 評価理由 再評価後5年経過

1. 事業の目的


寺沢川は、前橋市大胡町から、前橋市女屋町の桃ノ木川へ合流する延長12km、流域面積13.2km²の一級河川で、断面狭小で、河道が蛇行していることから、過去に幾度となく家屋や農地等の浸水被害が発生している。近年は、上・中流域で国道17号BP(上部国道)建設に伴い宅地開発が進み、下流域では前橋工業高校の移転など学園都市整備の開発が行われ、流域の都市化が進んでいる。このため、河川改修を行い、沿川の浸水被害を軽減することにより、安全で安心できる地域づくりを行うことを目的としている。



断面狭小



豪雨による氾濫状況

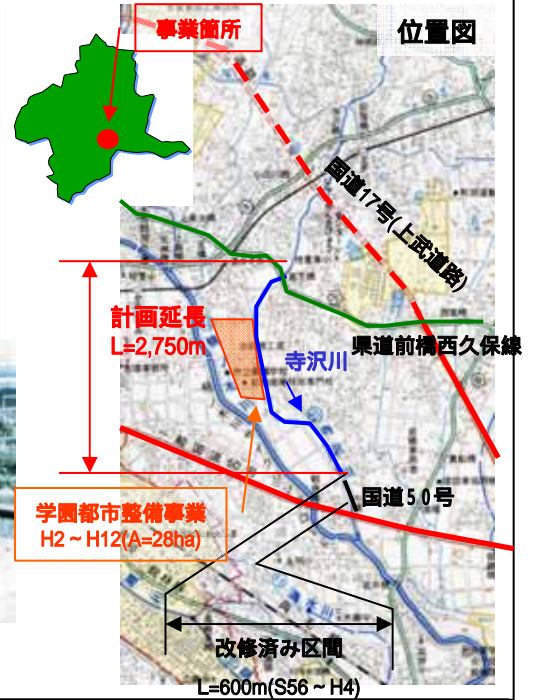

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	まえばしし おなやまち まえばしし かめいずみまち 前橋市女屋町～前橋市亀泉町	
区分	今回	前回再評価時
全体事業費	4,592百万円	5,983百万円
全体事業費増減の理由	事業計画見直しによる減少	
事業期間	H8～H28	H8～H24
事業内容	河川延長 2,750m 確率規模1/10 計画流下能力140m ³ /s (現況流下能力18.6m ³ /s)	河川延長 2,750m 確率規模1/10 計画流下能力140m ³ /s (現況流下能力18.6m ³ /s)

事業経緯

年度	主な経緯
H8	用地買収着工
H8	工事着工
H21	計画変更
H27	用地買収完了予定

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の進捗状況 (進捗率)
事業費	4,592百万円	1,799百万円 (39.2%)	1,069百万円 (23.3%)
用地買収	75,750m ²	38,890m ² (51.3%)	24,674m ² (32.6%)
計画延長	2,750m	1,126m (40.9%)	250m (9.1%)
