

# 第 8 号議案

社会資本整備総合交付金事業(河川改修)  
たつのくちかわ  
 一級河川竜の口川 前橋市

着工年度 平成 8 年度  
 評価理由 再評価後 5 年経過

## 1. 事業の目的

竜の口川は、赤城山麓南面中腹部から、前橋市上沖町で桃の木川へ合流する河川延長9.0km、流域面積10.6km<sup>2</sup>の一級河川である。竜の口川は断面狭小なうえ、河道が蛇行していることから、沿川地域では過去に幾度となく浸水被害が起きており、宅地・耕作地等に影響を与えていた。


また、竜の口川上流においては土地区画整理事業などの開発が行われ、近年急激に市街化が進んでいることから、河道の拡幅による護岸整備により、沿川地域の氾濫被害を防除するとともに、沿川地域からの流出増に対しても十分対応できるよう治水安全度を高めることを目的としている。



断面狭小(区画整理事業内)



豪雨による氾濫状況

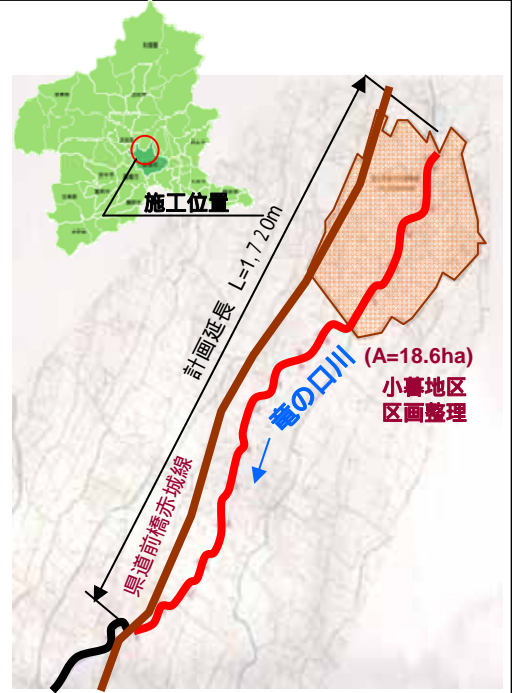

## 2. 事業概要と進捗状況

### 事業概要

事業場所	まえばしし ふじみちょう ときさわ まえばしし ふじみちょう ときさわ 前橋市富士見町時沢 ~ 前橋市富士見町時沢	
区分	今回	前回再評価時
全体事業費	1,530百万円	1,530百万円
全体事業費増減の理由		
事業期間	H8 ~ H25	H8 ~ H25
事業内容	計画延長 1,720m 確率規模 1 / 5 計画流量 40m <sup>3</sup> /S (現況流下能力16m <sup>3</sup> /s)	計画延長 1,720m 確率規模 1 / 5 計画流量 40m <sup>3</sup> /S (現況流下能力16m <sup>3</sup> /s)

### 事業経緯

年度	主な経緯	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の 進捗状況 (進捗率)
H8	事業認可			
H8	用地買収着手	1,530百万円	1,319百万円 (86.2%)	760百万円 (49.7%)
H8	工事着工	17,081m <sup>2</sup>	11,528m <sup>2</sup> (67.5%)	6,036m <sup>2</sup> (35.3%)
H23	用地買収完了予定	1,720m	1,040m (60.5%)	380m (22.1%)
