

# 第9号議案


社会資本整備総合交付金事業(河川改修)  
かぶらかわ  
 一級河川 鑓川 高崎市

着工年度  
 評価理由

平成16年度  
 再評価後5年経過

## 1. 事業の目的

鑓川は、西部地域を代表する河川延長約58.8km、流域面積632.4km<sup>2</sup>、69支川を持つ一級河川である。多胡橋上下流の本事業区間は、断面が狭小で河道が屈曲しているため、幾度となく家屋の浸水被害が発生している。平成19年の台風9号による出水では浸水面積3.3ha、床上浸水11戸、床下浸水6戸の被害が発生した。  
 このため、河川改修を行い、洪水による浸水被害を軽減することにより、安全で安心できる地域作りを行うことを目的にしている。

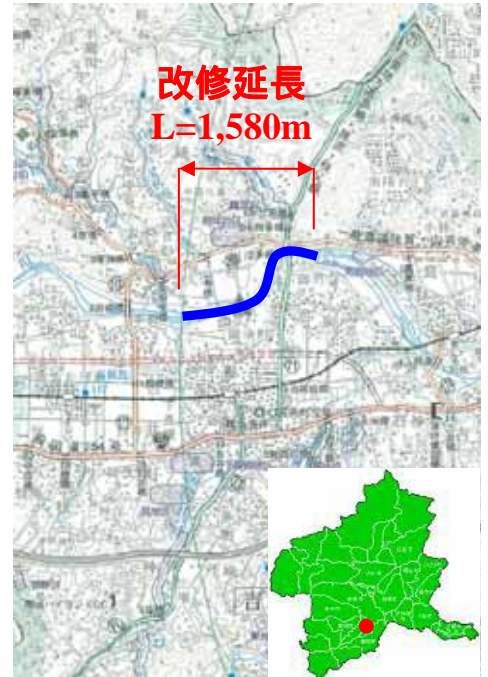

平成19年9月の台風による出水と浸水状況

## 2. 事業概要と進捗状況

### 事業概要

事業場所	たかさきよしいまちいわさき 高崎市吉井町岩崎 ~ たかさきよしいまちいけ 高崎市吉井町池	
区分	今回	前回(H17)再評価時
全体事業費	950百万円	1,340百万円
全体事業費増減の理由	護岸工見直しによるコスト縮減	
事業期間	H16~H25	
事業内容	改修延長 1,580m 計画規模 1/50 計画流量 3,200m <sup>3</sup> /s (現況流下能力1,300m <sup>3</sup> /s)	改修延長 1,080m 計画規模 1/30 計画流量 2,800m <sup>3</sup> /s (現況流下能力1,300m <sup>3</sup> /s)

### 事業経緯

### 進捗状況

年度	主な経緯		全体計画	現在の進捗状況(進捗率)	前回評価時の進捗状況(進捗率)
H16	事業着手				
H16	用地買収着手	事業費	950百万円	590.3百万円 (62.1%)	90百万円 (9.5%)
H17	工事着手	用地買収	24,100m <sup>2</sup>	21,600m <sup>2</sup> (89.6%)	9,746m <sup>2</sup> (40.4%)
H19	台風9号の出水による計画規模の見直し	計画延長	1,580m	780m (49.4%)	0m (0.0%)
