

第11号議案

社会資本整備総合交付金事業(河川改修)
ぬくいかわ
 一級河川温井川 高崎市・藤岡市

着工年度
 評価理由

平成12年度
 再評価後5年経過

1. 事業の目的

温井川は藤岡市～高崎市新町内を流下し、烏川に合流する流路延長約6.2kmの一級河川である。


断面狭小による流下能力不足により浸水被害が頻発していたため、過去に河道改修を行ったが、近年、流域内の都市化が急速に進んだことにより、再び事業所や家屋の浸水被害が発生している状況である。このため、河道改修により流下能力を向上させ、流域内における浸水被害の軽減を図ることを目的としている。



平成11年8月
 出水状況



平成10年9月
 出水状況

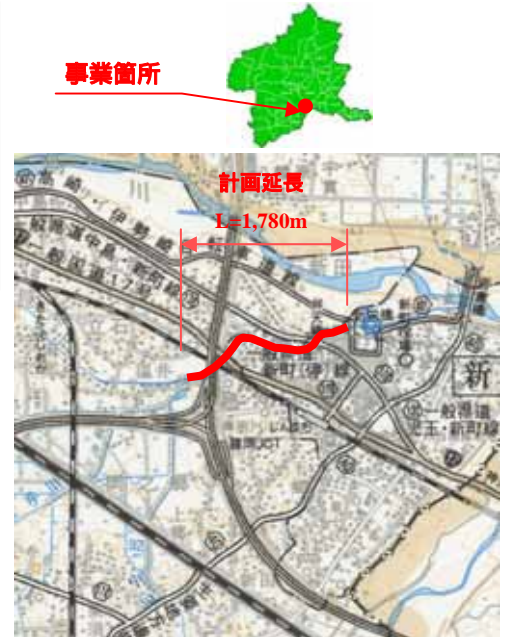

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	<small>たかさきしんまち</small> 高崎市新町 ~ <small>ふじおかしたつし</small> 藤岡市立石	
区分	今回	前回(H17)再評価時
全体事業費	2,410百万円	2,410百万円
事業期間	H12～H27	H12～H27
事業内容	河川延長 1,780m 計画規模 1/30 計画流量 163m ³ /s (現況流下能力約65m ³ /s)	河川延長 1,780m 計画規模 1/30 計画流量 163m ³ /s (現況流下能力約65m ³ /s)

事業経緯

年度	主な経緯
H12	事業着手
H15	用地買収着手
H17	工事着手

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回再評価時の進捗状況 (進捗率)
事業費	2,410百万円	932.9百万円 (38.7%)	325百万円 (13.5%)
用地買収	7,638m ²	4,290m ² (56.2%)	3,063m ² (40.1%)
計画延長	1,780m	214m (12.0%)	0m (0%)
		延長は左右岸護岸の整備済み平均による	
