

第14号議案


社会資本整備総合交付金事業(通常砂防)
かまたざわ
鎌田沢 東吾妻町

着工年度
評価理由

平成8年度
再評価後5年経過

1. 事業の目的

・上流域は急峻かつ脆弱な地層を有しており、浸食が激しく山腹には崩壊箇所も見られるなど荒廃が進んでおり、下流域の人家・国道等を土砂災害から保全するため堰堤工及び溪流保全工の整備を行うものである。

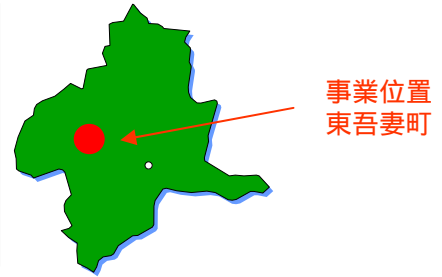

荒廃状況

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	あがつまぐん ひがしあがつままち まつや 吾妻郡 東吾妻町 松谷	
区分	今回	前回再評価時
全体事業費	1,300百万円	1,300百万円
全体事業費増減の理由		
事業期間	H8～H26	H8～H22
事業内容	堰堤工 2基 溪流保全工 L=775m 床固工 10基	堰堤工 2基 溪流保全工 L=775m 床固工 10基

事業経緯

年度	主な経緯
H8	事業認可
H17	用地買収着手
H18	工事着工
H21	堰堤2基完成
H22	溪流保全工着手

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況 (進捗率)	前回評価時の進捗状況 (進捗率)
事業費	1,300百万円	1,159百万円 (89.2%)	287百万円 (22.1%)
用地買収	19,595m ²	18,679m ² (95.3%)	0m ² (0.0%)
計画延長	堰堤工 2基 溪流保全工L=775m	堰堤工 2基 (100%) 溪流保全工 L=0m (0.0%)	堰堤工 0基 (%) 溪流保全工 L=0m (0.0%)
