

# 第17号議案

社会資本整備総合交付金事業(通常砂防)  
しおざわ  
塩沢 みなかみ町


着工年度  
評価理由

平成13年度  
10年継続

## 1. 事業の目的

・塩沢流域の人家などを土石流の被害から守り、安心して暮らせる地域をつくるために砂防堰堤(N=4基)を設置する。

### 荒廃状況

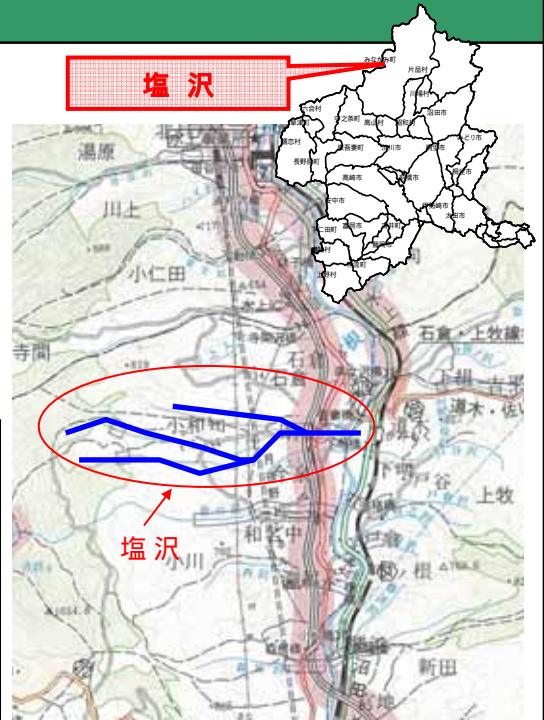

## 2. 事業概要と進捗状況

### 事業概要

事業場所	とねぐん みなかみまち いしくら 利根郡 みなかみ町 石倉	
区分	今回	事業当初
全体事業費	630百万円	650百万円
事業期間	H13～H24	H13～H22
事業内容	砂防堰堤 4基(1号,2号,4号,5号)	砂防堰堤 4基(1号,2号,4号,5号) 渓流保全工 L=200m

### 事業経緯

年度	主な経緯
H13	事業着手
H16	4号堰堤完成
H19	1号堰堤完成
H21	5号堰堤完成
H21	2号堰堤測量着手

### 進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況(進捗率)
事業費	630百万円	517百万円 (82.1%)
用地買収	39,800m <sup>2</sup>	30,400m <sup>2</sup> (76.4%)
事業内容	砂防堰堤 4基	砂防堰堤 3基 (75.0%)
