

第 3 号議案



農山漁村地域整備交付金(湛水防除事業)
わたらせがわちゅうおう1き
渡良瀬川中央1期 地区 太田市

着工年度
評価理由

平成13年度
10年継続

1. 事業の目的

本地域では農業用水路が地域排水の役割も担っており、流域内の開発に伴い雨水排水の流出量が増加し、水路からの溢水、農地の湛水により、農作物などに被害が発生している。
このため、農業経営の安定と国土保全を図るため、排水路工等の整備を行い、農地及び農作物への被害の軽減を図ることを目的としている。事業は、国営総合農地防災事業渡良瀬川中央地区と附帯県営事業で行っており、両事業が一体となって効果を発揮するものである。

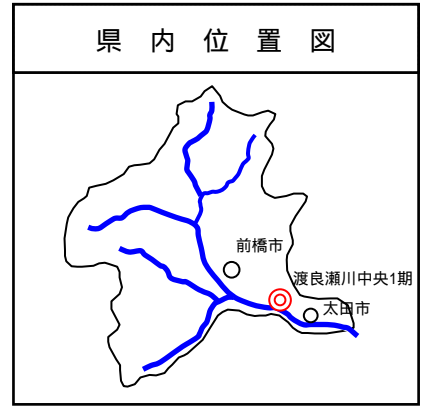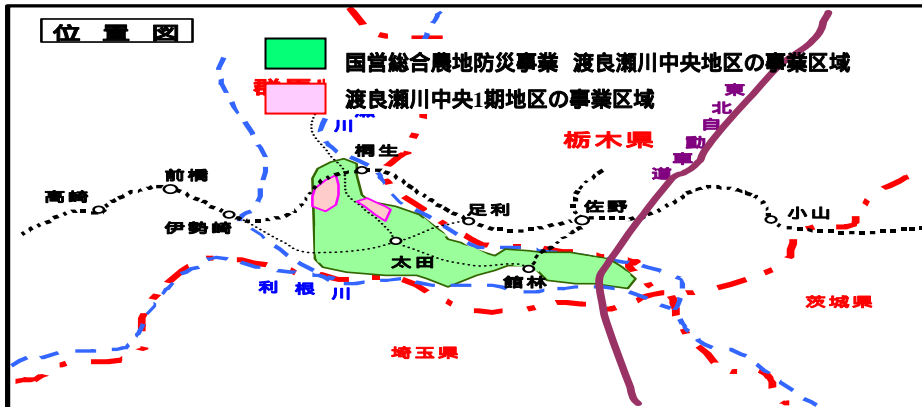

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	おあたしにしながおかちょう おあたしおほらちょう 太田市西長岡町～太田市大原町	
区分	今回	事業当初時
全体事業費	2,917百万円	3,530百万円
全体事業費増減の理由	・路線見直しによる水路延長減 ・水路補修等への工法変更	
事業期間	H13～H26	H13～H24
事業内容	排水路延長 9.7 km 水路断面 幅 1.5m～3.55m 高さ1.0m～1.6m	排水路延長 10 km 水路断面 幅 1.5m～3.55m 高さ1.0m～1.6m

事業経緯

年度	主な経緯
H14	用地買収着手
H14	工事着工
H18	岡登水路事業完了
H19	集水路3事業完了

進捗状況

	全体計画	現在の進捗状況(進捗率) H22.3月末日
事業費	2,917百万円	1,766百万円 (60.5%)
用地買収	22,700m ²	14,000m ² (61.7%)
計画延長	9,730m	6,073m (62.4%)
