


第 5 号議案

社会資本整備総合交付金事業
 りゅういきげすいどう さわしよりく
 流域下水道 佐波処理区 伊勢崎市、太田市

着工年度 平成13年度
 評価理由 10年継続

1. 事業の目的

- ・周辺住民の快適な生活環境を保護するとともに、進行しつつあった公共用水域の水質悪化を防止するため、市内から発生する汚水を処理する。
- ・事業進捗による供用開始区域の拡大に伴って、年々増加していく汚水を適正に処理する。
- ・これらの目的を達成するため、汚水を収集する管きよの敷設および処理施設能力の増加（水処理施設、汚泥処理施設等の増設）を段階的に図る。

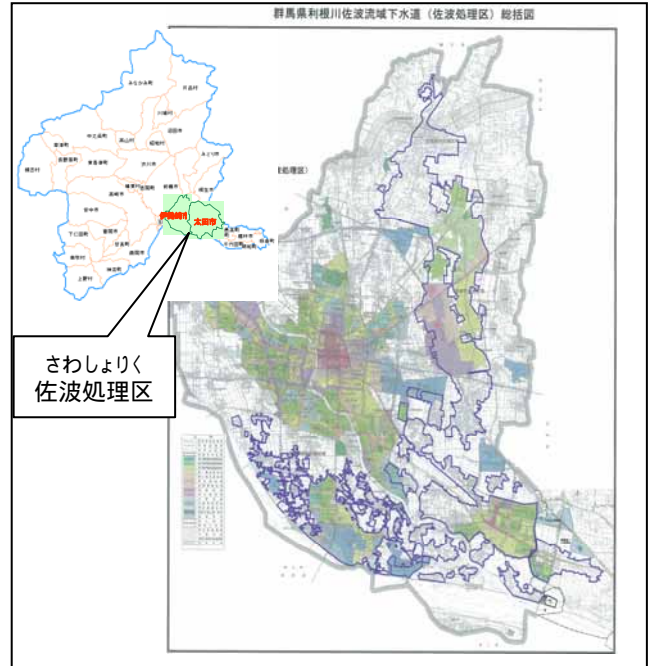

2. 事業概要と進捗状況

事業概要

事業場所	いせさきし おおたし し 伊勢崎市、太田市(2市)	
区分	今回	事業当初
全体事業費	41,000百万円	47,500百万円
全体事業費増減の理由	計画人口の減少に伴い 処理施設が減ったため	-
事業期間	H13～H38	H13～H27
事業内容 (全体計画)	処理面積 3,359ha 処理人口 82,8千人 処理水量 47.6千m ³ /日 水処理施設 4系列	処理面積 3,282ha 処理人口 93,4千人 処理水量 68.0千m ³ /日 水処理施設 6系列

事業経緯

年度	主な経緯
H13	利根川佐波流域下水道 (佐波処理区)として事業着手
H15	工事着手
H20	供用開始
H22	全体計画の見直し (処理面積及び人口)

進捗状況

	全体計画	現在の 進捗状況 (進捗率)	前回評価時の 進捗状況 (進捗率)
事業費	41,000百万円	17,023百万円 (41.5%)	-
整備面積	3,359ha	202ha (6.0%)	-
処理能力 (日最大)	47,600m ³ /日	5,450m ³ /日 (8.3%)	-
管渠延長	23.8km	15.5km (65.1%)	-
